



**Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua**

**DEPARTAMENTO DE
COHESIÓN TERRITORIAL**

**INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS**

AÑO 2021

31 de enero de 2022

INFORME ANUAL SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

ÍNDICE

	Página
PRESENTACIÓN	1
I.- N° DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS	3
II.- EVOLUCIÓN DE LAS ADJUDICACIONES DE OBRAS	3
III.- VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO 2012-2021	4
IV.- BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS	4
V.- DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS	5
INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS	8
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS. (Total Contratos)	9
ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS 2021. DISTRIBUCIÓN POR SERVI	11
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL. DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS.	12
RESUMEN GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	14
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS	15
EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS	17
RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS 2021	19
RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS 2021	22
RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN OBRAS	25
RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS 2021	27
RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS 2021	29
RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN / ADJUDICACIÓN ASISTENCIAS	31

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

INFORME ANUAL 2021 ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS

Después de dos años de pandemia se presenta el documento **“Informe Anual 2021”** de la Dirección General de Obras Públicas de Infraestructuras, del Departamento de Cohesión Territorial y en el que se incluyen los análisis y datos sobre las **Adjudicaciones y Liquidaciones de Obras y Asistencias Técnicas** realizadas a lo largo de 2021 por la citada Dirección General.

Tras la puesta en marcha de diversos proyectos, 2021 ha traído una gran inversión en obra pública quedando reflejada en este Informe Anual, pasando de 24 contratos adjudicados en 2020 a 51 en el año 2021, la cifra más alta en los últimos 10 años. Adjudicándose más de 114.166.000 euros en contratos de obras y asistencia.

Cabe reseñar como uno de los datos más significativos de la gestión, la Desviación Media Anual registrada en las obras liquidadas por la Dirección General, así como su evolución en los últimos años.

Conseguir una disminución sustancial de los costes finales de las obras, en relación con sus precios de adjudicación, es uno de los objetivos a cumplir por la Dirección General de Obras e Infraestructuras, y que ha motivado la elaboración de este Informe Anual, como un instrumento más del control de la gestión llevada a cabo.

Los resultados y cifras relevantes que se destacan a continuación, forman parte del documento, así como toda la información registrada a lo largo de 2021, en materia de adjudicaciones y liquidaciones de obras y asistencias técnicas de esta Dirección General.

RESULTADOS 2022	
ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS 2012-2021	
VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADO EN 2020	110.538.132,99 euros
VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN 2020	49.084.245,55 euros
DESVIACIÓN-INCREMENTO MEDIO EN LAS OBRAS LIQUIDADAS EN 2020	0,09%
Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN-INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN SUPERIOR AL 10 % EN 2020	1
Nº DE CONTRATOS CON DESVIACIÓN-INCREMENTO EN LIQUIDACIÓN INFERIOR AL 10 % EN 2020	27
VOLUMEN DE OBRA ADJUDICADO EN EL PERIODO 2011-2020	561.928.504,56 euros
VOLUMEN DE OBRA LIQUIDADA EN EL PERIODO 2011-2020	535.511.002,80 euros
DESVIACIÓN-INCREMENTO MEDIO EN LAS LIQUIDACIONES DE OBRA EN EL PERIODO 2011-2020	+0,51%

I. NÚMERO DE CONTRATOS ADJUDICADOS Y LIQUIDADOS

El número total de contratos, adjudicados y liquidados a lo largo del año 2021, tanto de obras, como de asistencias técnicas, refleja una parte de la actividad desarrollada por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras.


En la siguiente tabla se muestra la evolución de estas cifras totales durante los últimos años:

Año	Contratos adjudicados	Contratos liquidados
2012	29	47
2013	40	46
2014	28	25
2015	32	29
2016	24	30
2017	40	33
2018	40	41
2019	31	26
2020	24	26
2021	51	39

II. EVOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS

ADJUDICACIONES DE OBRA	
AÑO	IMPORTE (Euros)
2012	64.333.857
2013	15.513.637
2014	22.855.160
2015	76.422.915
2016	7.311.705
2017	16.564.031
2018	58.703.366
2019	98.560.134
2020	10.219.928
2021	110.538.133

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS IMPORTE
DE OBRA ADJUDICADA EN MILES DE EUROS**

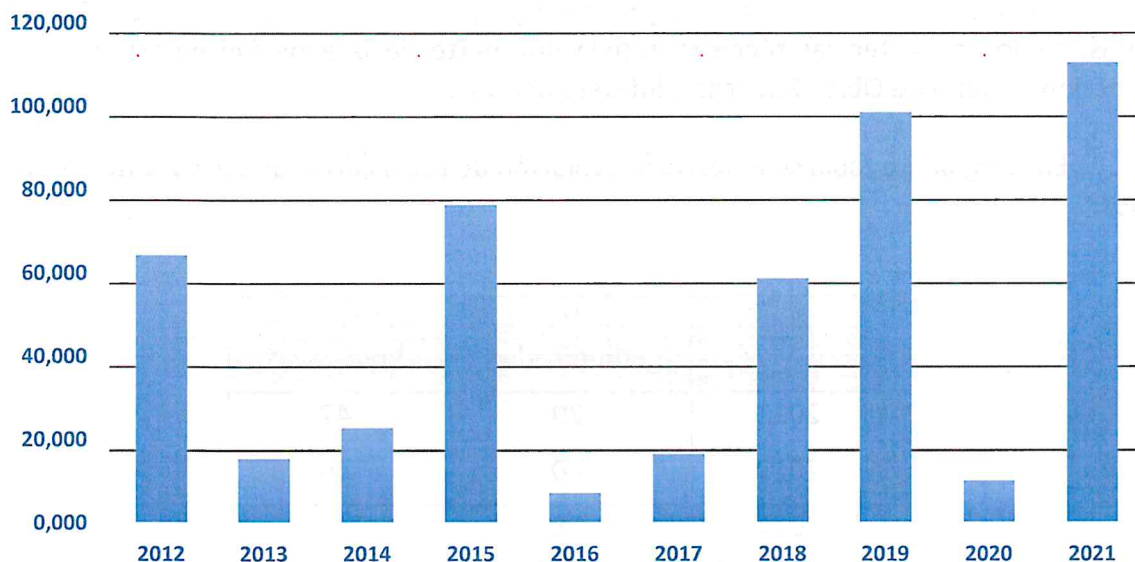


III. VOLUMEN ADJUDICADO EN EL PERIODO 2012 – 2021

El importe total de contratación de obras tramitadas por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, en los últimos diez años (2012-2021), ha ascendido a **561.928.504,56 euros**.

IV. BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE OBRAS

La **Baja Media Anual en las Adjudicaciones** de obra es, asimismo, un dato representativo de la gestión de la contratación. Se obtiene comparando el total de Presupuesto Adjudicado de la obra con el Presupuesto del Proyecto aprobado por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras (Presupuesto de licitación). Los datos referentes a esta Baja Media Anual son los siguientes:

AÑO	BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS
2012	-21,1 %
2013	-18,6%
2014	-8,56%
2015	-11,9%
2016	-15,75%
2017	-27,79%
2018	-15,00%
2019	-12,93%
2020	-21,54%
2021	-12,80%

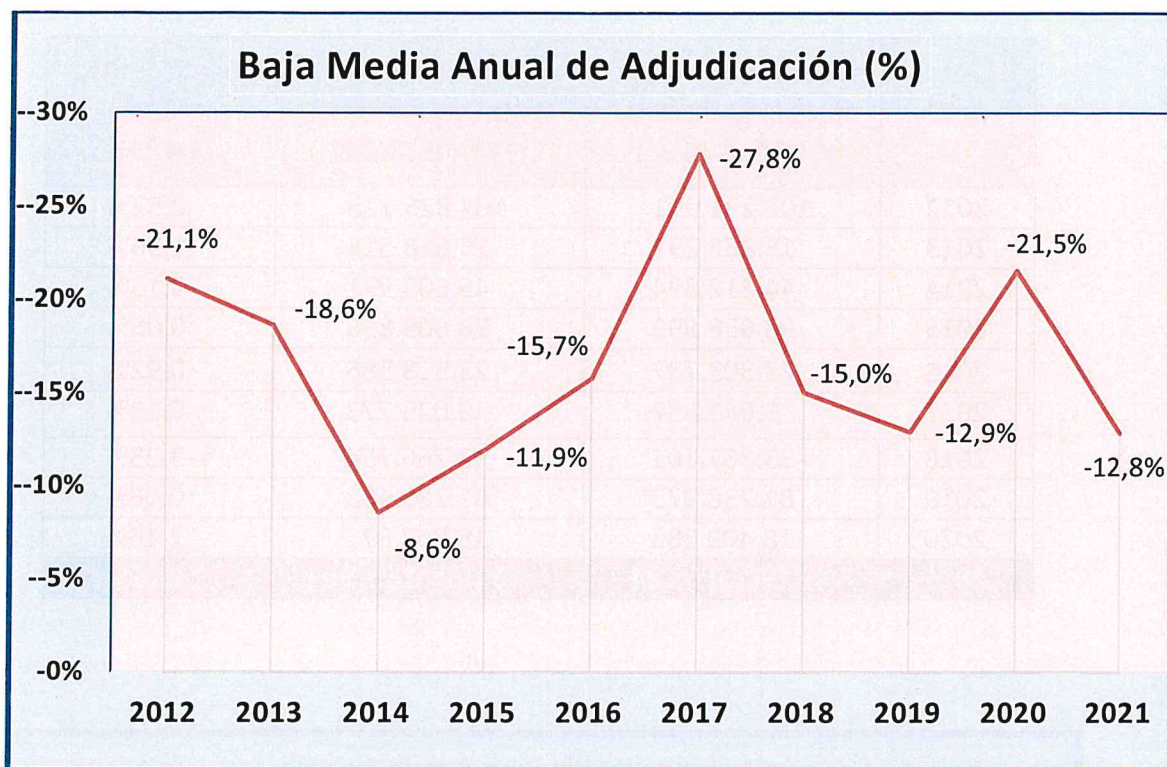

V. DESVIACIÓN MEDIA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS

La **desviación media anual**, sin duda, es uno de los datos de mayor relevancia desde el punto de vista de gestión de la Administración en relación con sus contratos de obras. El objetivo marcado es no superar, como media el 10% sobre los presupuestos de adjudicación. La evolución **decididamente positiva** en este parámetro responde al esfuerzo técnico y a la labor de control de la Administración.

El resumen de la evolución de este indicador se recoge en la tabla y en el gráfico adjunto. Tal y como se comprueba en dichos datos, **en el año 2021 se ha registrado una desviación media anual de 0,09 %** en los contratos de obra, respecto de los importes de adjudicación lo cual significa que nos mantenemos en los valores correctos para cumplir el objetivo marcado.



AÑO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA (EUROS)	IMPORTE LIQUIDACIONES DE OBRA (EUROS)	DESVIACION MEDIA ANUAL
2012	102.291.911	102.825.125	0,52%
2013	15.866.297	15.618.514	-1,56%
2014	44.212.894	45.605.931	3,15%
2015	98.658.590	98.609.896	0,05%
2016	23.303.787	23.518.586	0,92%
2017	9.041.537	9.025.273	-0,18%
2018	33.867.101	32.766.754	-3,25%
2019	81.238.973	81.285.488	0,06%
2020	18.409.385	18.807.377	2,16%
2021	49.041.274,24	49.084.245,55	0,09%



NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS			
Año	Más del 10% de desviación final	Menos del 10% de desviación final	TOTAL CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS
2012	1	27	28
2013	1	24	25
2014	0	7	7
2015	0	15	15
2016	0	14	14
2017	0	15	15
2018	0	20	20
2019	0	17	17
2020	1	8	9
2021	1	27	28

A lo largo de los diez últimos años, entre 2012 y 2021, se ha liquidado un importe total de **47.714.771,33 euros** con una desviación media final del **0,26 %**





Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

**DEPARTAMENTO DE
COHESIÓN TERRITORIAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURAS**

**INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y ASISTENCIAS**

AÑO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES CONJUNTAS DE OBRAS Y ASISTENCIAS (TOTAL CONTRATOS)

RESUMEN 2021

Número de contratos adjudicados y liquidados

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº Contratos Adjudicados	29	33	16	32	24	40	40	31	24	51
Nº Contratos Liquidados	45	38	19	29	30	33	41	26	26	39

Contratos Adjudicados:

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja media anual de adjudicación (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuestos licitación	83,306	20,371	26,030	89,548	9,755	25,281	76,974	115,924	16,101	130,993
Presupuestos adjudicación	65,722	16,789	23,839	78,647	8,259	18,609	66,458	100,936	12,796	114,166
Baja %	-21,11%	-17,58%	-8,42%	-12,17%	-15,34%	-26,39%	-13,66%	-12,93%	-20,52%	-12,85%

Contratos Liquidados:

Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Media Anual (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuestos adjudicación	108,370	18,211	46,122	101,920	24,635	11,186	41,415	82,470	19,897	50,226
Presupuestos liquidación	108,529	17,989	47,550	101,833	24,821	11,564	40,592	82,504	20,276	50,226
Desviación en liquidación	+ 0,15%	- 1,21%	+ 3,10%	- 0,09%	+ 0,76%	+ 3,37%	- 1,99%	+ 0,04%	+ 1,91%	+ 0,00%

Contratos Adjudicados:


Porcentaje de Sistemas de Adjudicación

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mejor Calidad-precio	93,77%	1,81%	63,34%	97,06%	83,30%	70,10%	69,64%	70,73%	79,53%	94,84%
Precio ofertado	0,00%	56,43%	7,51%	1,48%	7,33%	20,56%	10,20%	15,15%	12,74%	3,05%
Proc. Negociado	1,12%	9,49%	0,71%	0,66%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos	3,34%	15,34%	28,44%	0,81%	7,91%	6,22%	20,16%	5,11%	7,73%	0,94%
Emergencias	1,77%	16,93%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%	0,00%	9,01%	0,00%	1,16%


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
BAJA MEDIA ANUAL DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

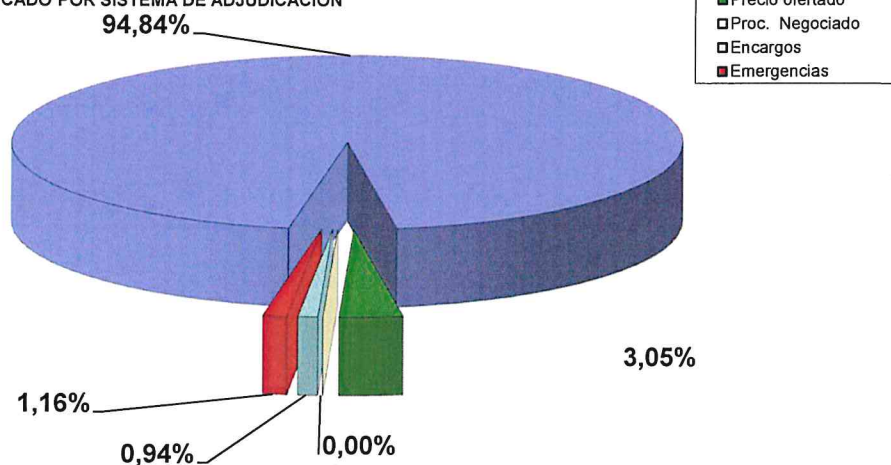

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO POR SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

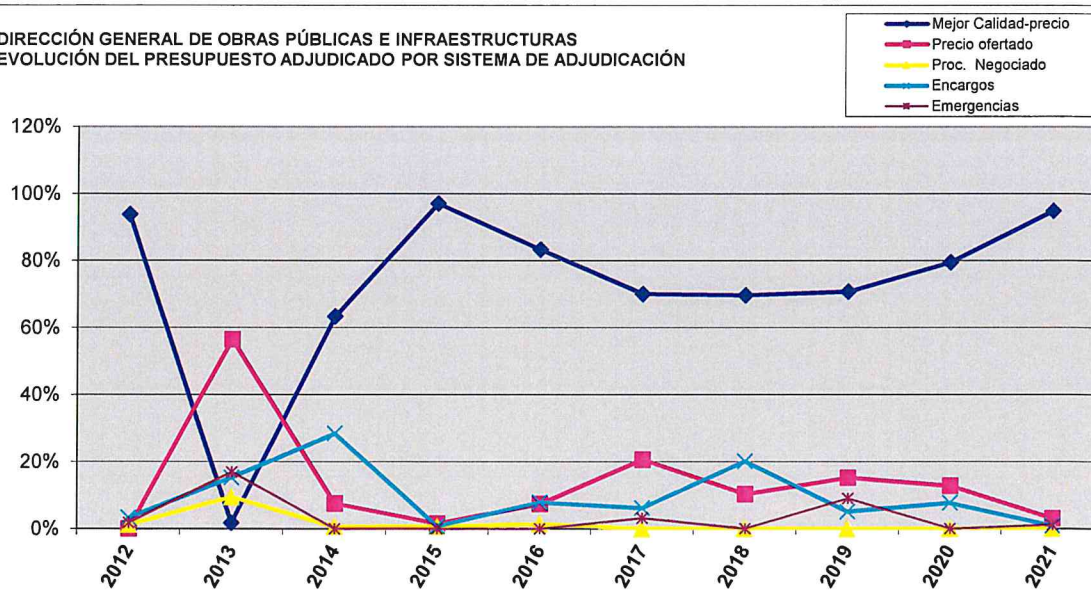

DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL DE CONTRATOS

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS


PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN APLICADOS EN EL AÑO 2021

PROCEDIMIENTO	SERVICIO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS			SERVICIO DE CONSERVACIÓN			SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	Nº Cont.	Suma Presupuestos	%	Nº Cont.	Suma Presupuestos	%	Nº Cont.	Suma Presupuestos	%
Mejor calidad-precio	18	46.591.897	100,00%	21	62.129.805	92,78%	0	0	0,00%
Precio ofertado	0	0	0,00%	6	3.500.000	5,23%	0	0	0,00%
Negociado	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Encargo	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	1.075.564	100,00%
Emergencia	0	0	0,00%	2	1.335.243	1,99%	0	0	0,00%
TOTAL	18	46.591.897	100,00%	29	66.965.048	100,00%	4	1.075.564	100,00%

TOTALES

PROCEDIMIENTO	Nº	Suma	
	Cont.	Presupuestos	%
Mejor calidad-precio	39	108.721.703	94,84%
Precio ofertado	6	3.500.000	3,05%
Negociado	0	0	0,00%
Encargo	4	1.075.564	0,94%
Emergencia	2	1.335.243	1,16%
TOTAL	51	114.632.509	100%

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS

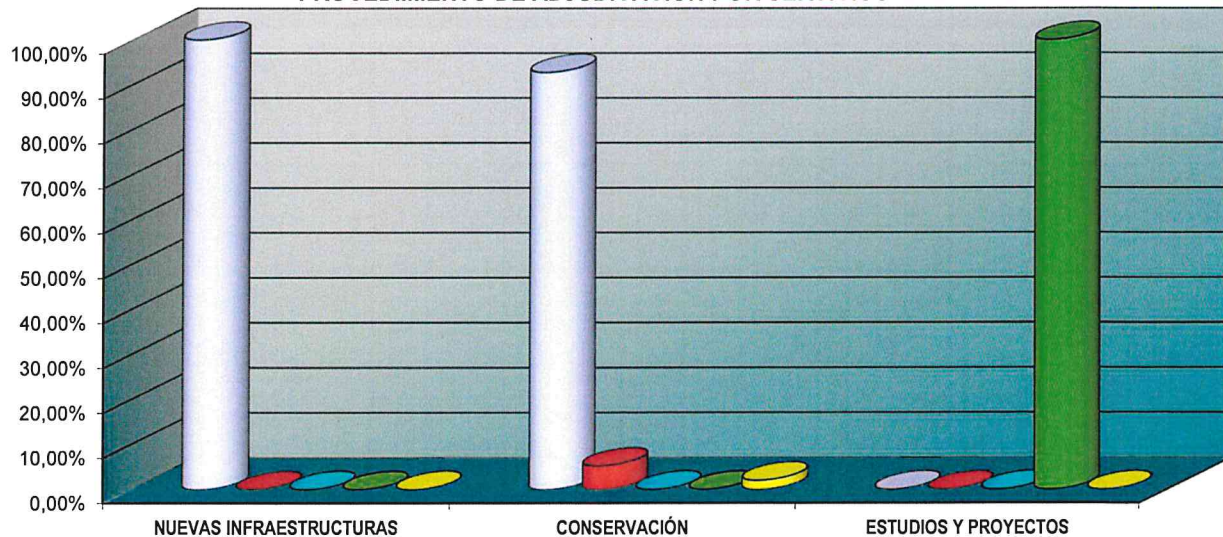

□ Mejor calidad-precio


■ Precio ofertado

■ Negociado

■ Encargo

■ Emergencia

TOTAL CONTRATOS ADJUDICADOS POR SERVICIOS

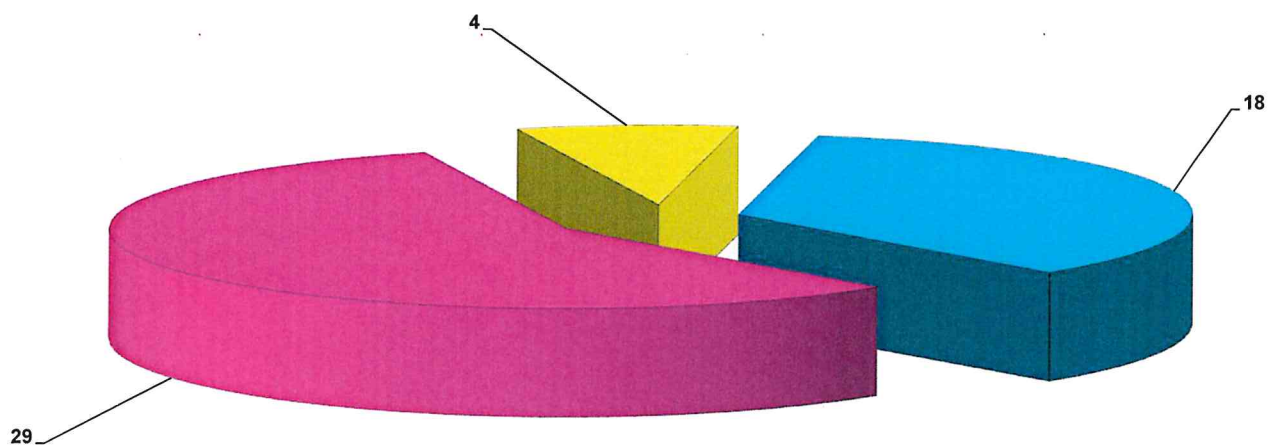


■ SERV. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

■ SERV. CONSERVACIÓN

■ SERV. ESTUDIOS Y PROYECTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN POR SERVICIOS

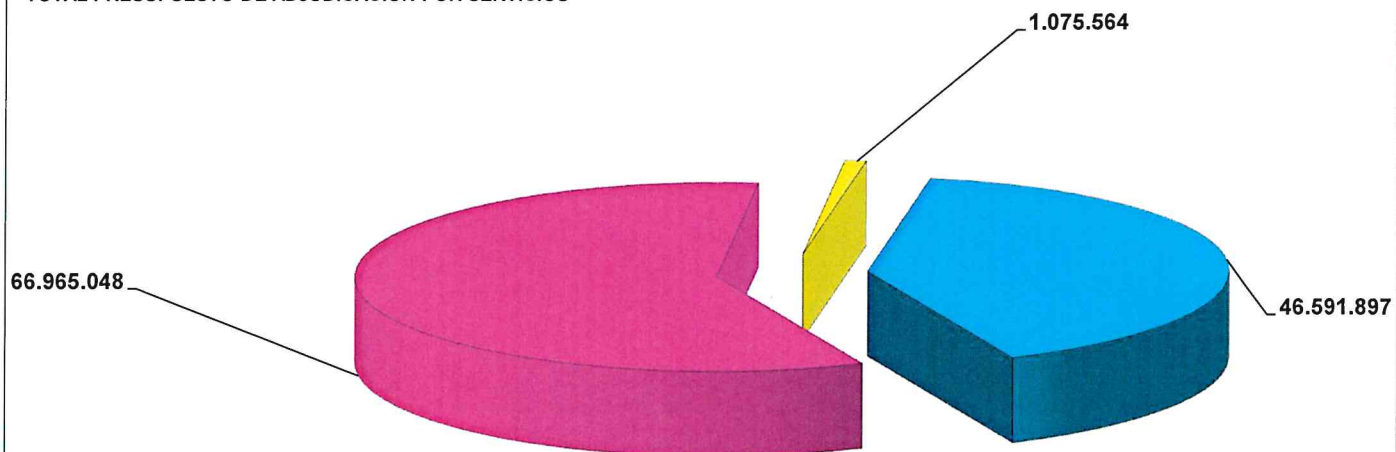

■ SERV. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

■ SERV. CONSERVACIÓN

■ SERV. ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Y ASISTENCIAS EN EL AÑO 2021 DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS

I OBRAS

<u>ADJUDICACIONES</u>	OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2021			
	Nº OBRAS ADJUDIC.	SUMA PRESUPUESTOS LICITACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	BAJA MEDIA REGISTRADA
N. INFRAESTRUCTURAS	17	18.904.474	16.043.033	- 15,14%
CONSERVACION	27	69.867.364	64.412.512	- 7,81%
PROYECTOS	2	500.000	400.000	+ 0,00%
TOTAL	46	89.271.838	80.855.545	- 9,43%

<u>LIQUIDACIONES</u>	OBRAS LIQUIDADAS AÑO 2021			
	Nº OBRAS LIQUIDADAS	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA % LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN
N. INFRAESTRUCTURAS	7	3.057.250	3.094.905	+ 1,23%
CONSERVACION	22	46.279.380	46.288.076	+ 0,02%
PROYECTOS	0	-	-	+ 0,00%
TOTAL	29	49.336.630	49.382.981	+ 0,09%

II ASISTENCIAS

<u>ADJUDICACIONES</u>	ASISTENCIAS ADJUDICADAS AÑO 2021			
	Nº ASISTENCIAS ADJUDIC.	SUMA PRESUPUESTOS LICITACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	BAJA MEDIA REGISTRADA
AÑO 2021				
N. INFRAESTRUCTURAS	1	466.276	466.276	+ 0,00%
CONSERVACION	2	3.150.290	2.552.537	- 18,97%
PROYECTOS	4	1.075.564	1.075.564	+ 0,00%
TOTAL	7	4.692.129	4.094.376	- 12,74%

<u>LIQUIDACIONES</u>	ASISTENCIAS LIQUIDADAS AÑO 2021			
	Nº ASISTENCIAS LIQUIDADAS	SUMA PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	SUMA PRESUPUESTOS LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA% LIQUIDACIÓN ADJUDICACIÓN
N. INFRAESTRUCTURAS	0	-	-	+ 0,00%
CONSERVACIÓN	2	418.314	428.252	+ 2,38%
PROYECTOS	9	744.088	713.503	- 4,11%
TOTAL	11	1.162.402	1.141.755	- 1,78%

**DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS**

AÑO 2021

RESUMEN GENERAL

**ADJUDICACIONES Y LIQUIDACIONES
DE CONTRATOS DE OBRAS Y
ASISTENCIAS**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE OBRAS

AÑO 2021

Número de obras adjudicadas y liquidadas

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº Obras Adjudicadas	20	24	6	14	6	21	22	17	7	44
Nº Obras Liquidadas	28	25	7	15	14	15	20	17	9	28

Obras Adjudicadas:

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuestos licitación	81,531	19,059	24,995	86,785	8,678	22,939	69,059	113,116	13,025	126,767
Presupuestos adjudicación	64,334	15,514	22,855	76,423	7,312	16,564	58,703	98,560	10,220	110,538
Baja Media Anual de Adjudicación (%)	- 21,09%	- 18,60%	- 8,56%	- 11,94%	- 15,75%	- 27,79%	- 15,00%	- 12,87%	- 21,54%	- 12,80%

Obras Adjudicadas:

Porcentaje de Sistemas de Adjudicación (sobre el total de presupuesto adjudicado) (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mejor calidad-precio	94,39%	0,00%	65,23%	97,55%	92,50%	71,44%	78,79%	95,54%	82,34%	95,00%
Precio oferta	0,00%	66,74%	10,23%	1,82%	7,38%	26,02%	12,24%	3,14%	17,66%	3,94%
Proc. Negociado	1,01%	9,71%	0,55%	0,63%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos	2,79%	8,64%	23,99%	0,00%	0,00%	0,00%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Emergencias	1,42%	14,91%	0,00%	0,00%	0,00%	2,54%	0,00%	1,31%	0,00%	1,05%

Obras Liquidadas:





Presupuestos de Adjudicación / Liquidación y Desviación Final de Obras (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuestos adjudicación	102,292	15,866	44,213	98,659	23,304	9,042	33,867	81,238	18,409	49,041
Presupuestos liquidación	102,825	15,619	45,606	98,610	23,519	9,025	32,767	81,285	18,807	49,084
Desviación Final de Obras (%)	+ 0,52%	- 1,56%	+ 3,15%	- 0,05%	+ 0,92%	- 0,18%	- 3,25%	+ 0,06%	+ 2,16%	+ 0,09%

Obras Liquidadas:

Número de obras según su desviación final de obra

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Más del 10% de desviación final de obra	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
Menos del 10% de desviación final de obra	27	24	7	15	14	15	20	17	8	27

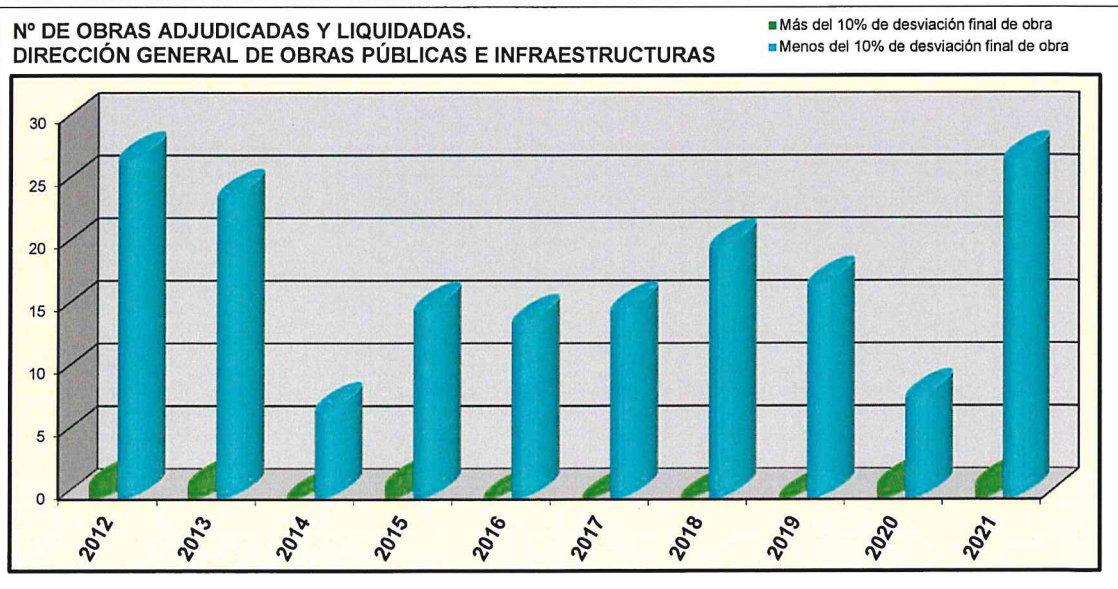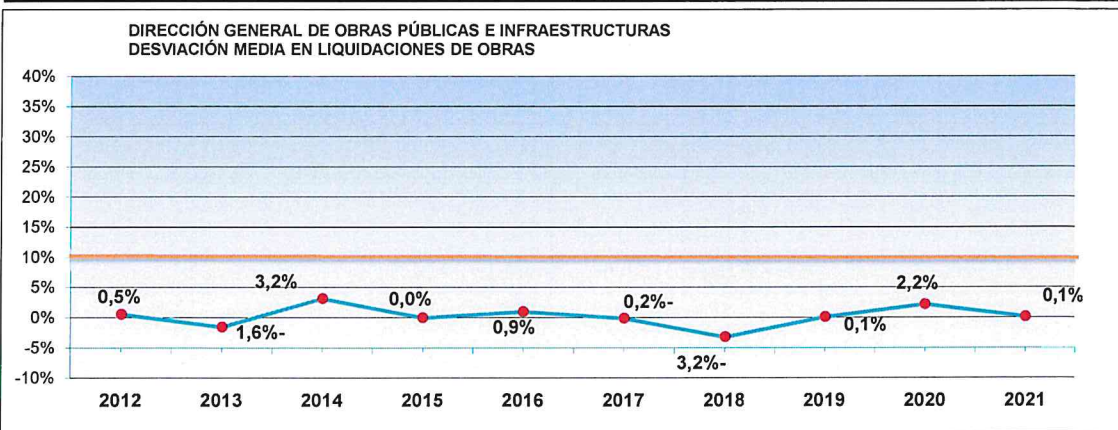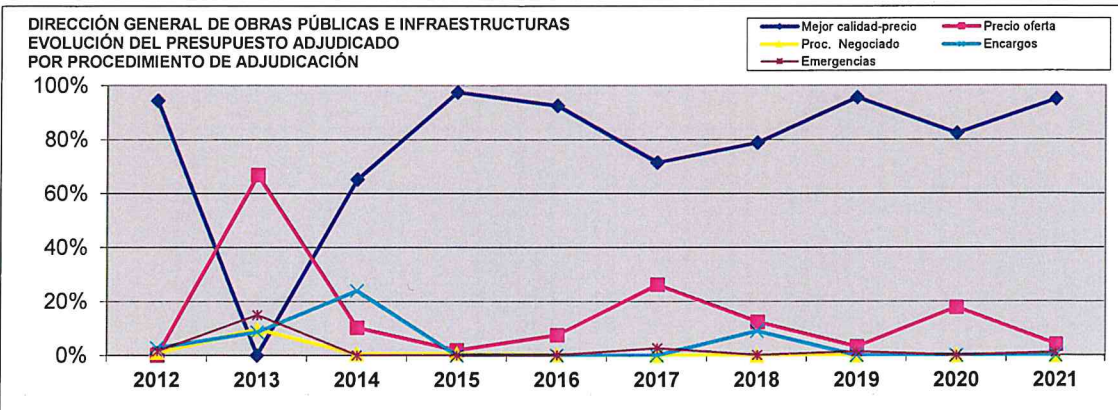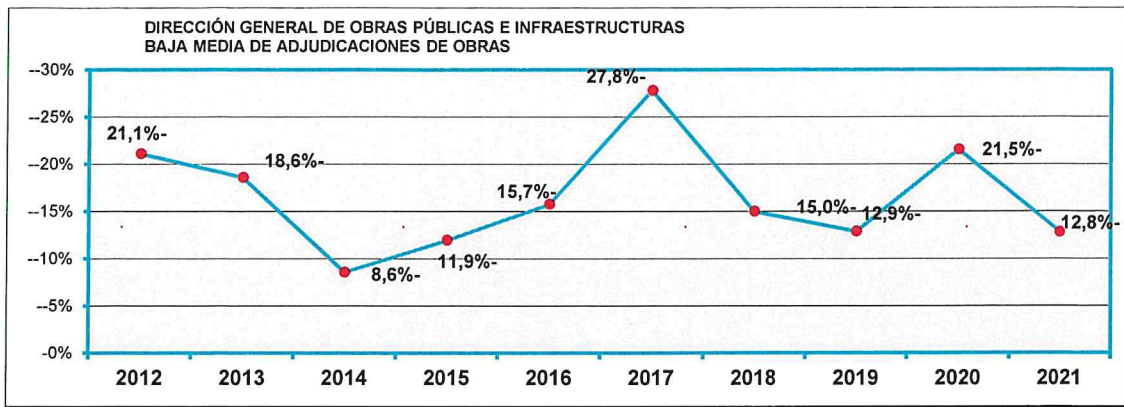


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES DE CONTRATOS DE ASISTENCIAS

AÑO 2021


Número de Asistencias Adjudicadas

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Nº Asistencias Adjudicadas	9	9	10	18	18	19	19	18	14	17
Nº Asistencias Liquidadas	17	13	12	14	16	18	18	21	9	17

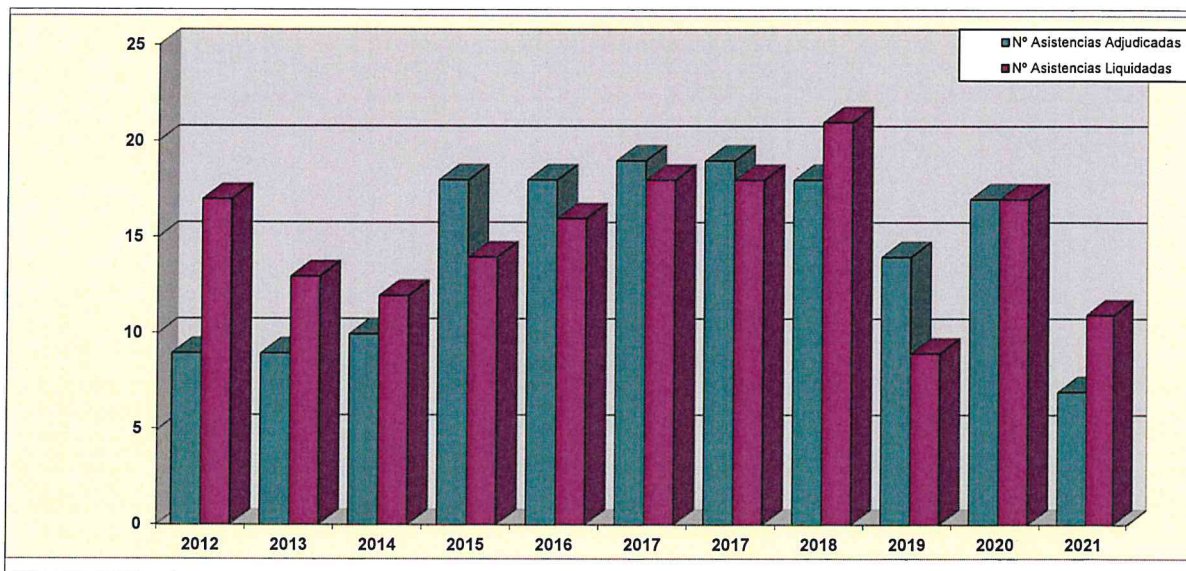

Presupuestos de Licitación/Adjudicación y Baja Media Anual de Adjudicación (en millones de euros)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Presupuestos de licitación	1,774	1,312	1,035	2,763	1,076	2,343	2,343	7,915	2,808	3,076
Presupuestos de adjudicación	1,388	1,275	0,984	2,224	0,947	2,045	2,045	7,755	2,376	2,577
Baja media anual de adjudicación (%)	-21,79%	-2,81%	-5,01%	-19,51%	-12,00%	-12,73%	-12,73%	-2,02%	-15,39%	-16,23%

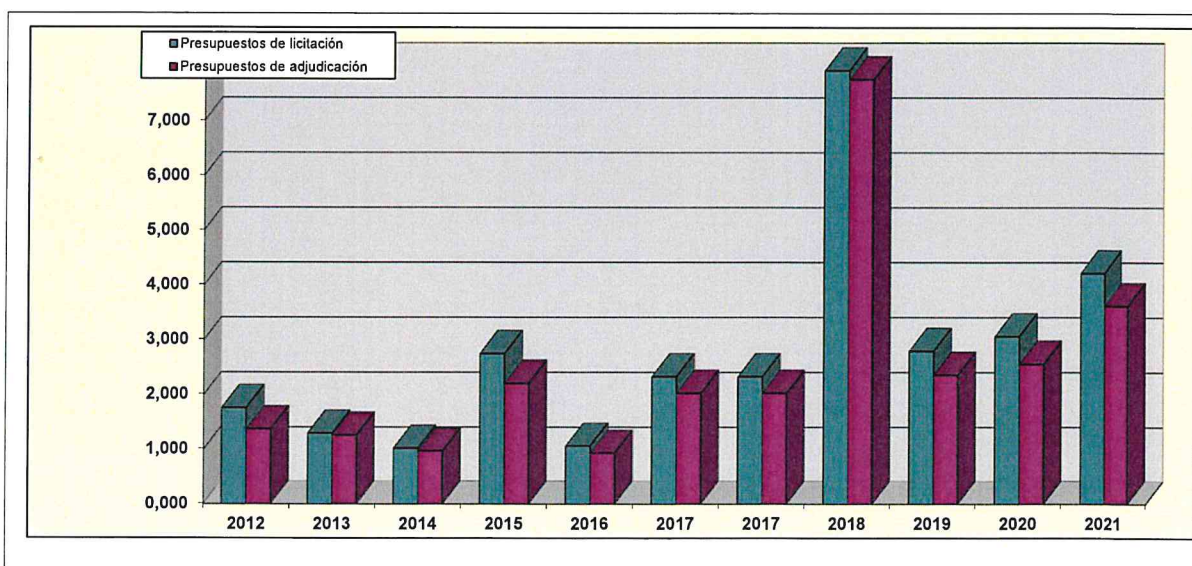

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS**

**RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS
AÑO 2021**

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS ADJUDICADAS EN 2021

nº de orden	TÍTULO DE LA OBRA	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	% BAJA	SERVICIO
1	Mantenimiento del Centro de Control y de los sistemas e instalaciones de él dependientes, túneles, alumbrado, semáforos y aforadores, años 2021-2024	UTE SICE, S.A./ETRA NORTE, S.A.	5.079.399,60	-8,00%	CO
2	Acondicionamiento de las intersecciones de PK 11+340 y 12+260 de la Ctra. NA-122, Variante de Allo	Excav. Fermín Osés, S.L.	694.193,07	-20,00%	NI
3	Conversión de la carretera N-121-A, Pamplona-Behobia, en vía 2+1 entre el PK 10+500 (Travesía de Olabe) y el PK 22+500	Const. Mariezcurrena, S.L.	10.844.559,21	-20,00%	NI
4	Ensanche y mejora de la carretera NA-5221, tramo: Cortes - Límite de provincia	Construcciones Boreste, S.A.	295.356,00	-15,08%	NI
5	Modificación de la intersección del cruce del polígono industrial y campo de fútbol en la NA-134, Cárcar	Construcciones Boreste, S.A.	367.052,57	-14,30%	NI
6	Rehabilitación estructural del puente de la Ronda de Pamplona, PA-30 PK 0+300, situado sobre la AP-15, Autopista de Navarra	Construcciones Mariezcurrena, S.A.	1.335.242,86	0,00%	CO
7	Adaptación de terminales de sistemas de contención metálicos en diversas carreteras de la CFN, Fase V, año 2021	Vallas Castiñeiras, S.L.L.	300.000,00	-25,00%	CO
8	Redistribución del nudo semafórico entre la A-12 (Autovía del Camino) y la A-15 (Ronda de Pamplona) en Zizur Mayor	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	636.126,05	-6,31%	NI
9	Estabilización del deslizamiento en la carretera NA-5310, PK 5+000, Ujué	Const. Mariezcurrena, S.L.	339.405,00	-19,99%	NI
10	Acondicionamiento de la intersección de la carretera NA-134, P.K. 52+300, San Adrián, Navarra	Excav. Fermín Osés, S.L.	864.808,90	-20,00%	NI
11	Ensanche y mejora de la ctra. NA-6008 , Salinas de Pamplona-Esparza de Galar, Navarra	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	1.421.179,84	-11,25%	NI
12	Estabilización y drenaje deslizamiento de tierras ocurrido en la parcela 395, Polígono 2, de Leitza	Lakita, S.A.	73.781,37	-3,80%	CO
13	Rehabilitación de firme de las carreteras N-240-A, Pamplona-Vitoria/Gasteiz, PK 7+200 y 11+000; PA-34, Accesos Pamplona Oeste, entre los PK 1+600 y 2+500 y PA-30, Ronda de Pamplona PK 18 al 22+000	Viaria Aglomerado, S.L.	945.000,00	-30,00%	CO
14	Rehabilitación de firme de la carretera NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides) PK 4+350 (Urtasun) y 11+600 (Cruce de Artesiaga)	Viaria Aglomerado, S.L.	455.000,00	-30,00%	CO
15	Rehabilitación de firme de la carretera NA-120 (Estella-Beasain) entre PK 31 (Puerto de Lizarraga) y 38 (Travesía de Etxarri Aranatz) en diferentes tramos de la A-10 (Autovía de la Barrantza) entre PK 15+500 (Lakuntza) y 29+500 (Altsasu/Alsasua)	Asfaltos Biurrun, S.A.	665.000,00	-30,00%	CO
16	Rehabilitación de firme de la carretera NA-129 (Aceso-Lodosa) entre PK 30+380 y 34+250 de la ctra. NA-134, Eje del Ebro, entre PK 76+290 y 79+250	Excavaciones Redondo Solozabal, S.L.	455.000,00	-30,00%	CO
17	Rehabilitación de firme de la carretera N-121, Pamplona-Tudela, entre los PK 26+650 y 29+800, y NA-115, Tafalla-Peralta-Rincón de Soto entre los PK 9+700 y 12+200	Conservacion y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	455.000,00	-30,00%	CO

18	Rehabilitación de firme de las carreteras N-113, Pamplona-Madrid, PK 98+000 y 101+380 y NA-115, Tafalla-Peralta-Rincón de Soto entre PK 13+500 y 22+500	Conservacion y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	525.000,00	-30,00%	CO
19	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Irurtzun, 2021-2025	UTE Ferroser Infraestructuras, S.A. / Lakita, S.A.	15.000.000,00	0,00%	CO
20	Conservación integral de las Autovías del Centro de Conservación de Irurtzun, A-15, A-10 y A-1, 2021-2025	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	13.750.000,00	0,00%	CO
21	Pantallas acústicas en el entorno de la PA-30 PK 14+600 al 15+350 Ezkaba (Pamplona)	Excav. Fermín Osés, S.L.	580.352,72	-20,00%	NI
22	Instalación, reposición, mantenimiento y elevación de barreras de seguridad, años 2021-2025	Vallas Castiñeiras, S.L.L.	3.868.384,00	-7,01%	CO
23	Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carreteras de la CFN, Grupo Norte, años 2021-2025	Señalizaciones Eder, S.A.	2.722.400,00	-18,00%	CO
24	Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carreteras de la CFN, Grupo Sur, años 2021-2026	Señalizaciones Eder, S.A.	2.722.400,00	-18,00%	CO
25	Pintado y repintado de marcas viales en la Red de Carreteras de la CFN, Grupo Oeste, años 2021-2027	Señalizaciones Eder, S.A.	2.722.400,00	-18,00%	CO
26	Reparación del puente de acceso a Andelos sobre el río Arga en Mendigorria (Res. 1322/21, 28 diciembre, suspensión temporal de las obras con efecto del 1 de diciembre por los daños estructurales del puente producidos por el temporal de lluvias del 9 al 14 de diciembre)	Díez y Compañía, S.A.	264.157,45	-12,90%	CO
27	Desdoblamiento del tramo: Variante de Orkoien - Enlace de Arazuri	Excav. Fermín Osés, S.L.	2.107.398,69	-20,00%	NI
28	Nuevo enlace a la Ronda Este: Soto de Lezkairu-Entremutillas, Fase 1	Const. Mariezcurrena, S.L.	2.348.474,17	-20,00%	NI
29	Conservación señalización vertical carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo I, años 2021-2025	Señalizaciones Villar, S.A.	3.320.000,00	0,00%	CO
30	Conservación señalización vertical carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, Grupo II, años 2021-2025	Señalizaciones Villar, S.A.	3.320.000,00	0,00%	CO
31	Reparación de estructura sobre vías ADIF en PA34, PK 1+100	IMESAPI, S.A.	578.338,41	-9,98%	CO
32	Reparación y refuerzo del Puente de Tudela sobre el río Ebro en Navarra	UTE Alvac, S.A / Orion Reparación Estructural, S.L.	1.572.170,30	-13,10%	CO
33	Reforma de la intersección de la Ctra. NA-6840 en Murchante, Navarra	Const. Boreste, S.A.	250.516,02	-7,80%	NI
34	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Tafalla, 2021	Conservacion y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	750.000,00	-25,00%	CO
35	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Aoiz, 2021	Asfaltos de Oskia, S.A.	750.000,00	-25,00%	CO
36	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Irurtzun, 2021	Asfaltos de Biurrun, S.A.	750.000,00	-25,00%	CO

37	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Estella-Lizarra 2021	Asfaltos del Ebro, S.L.	750.000,00	-25,00%	CO
38	Pasarela peatonal ctra. N-150 en Itaroa (Huarte)	Guillen Obras y Proyectos, S.L.	585.900,22	-8,38%	NI
39	Construcción de la ctra. NA-7010 (Astráin-Irurtzun). Tramo variante de Irurtzun	Construcciones Boreste, S.A.	1.124.594,98	-13,25%	NI
40	Semaforización del nudo del PK 18+280 de la PA-30-3 Ronda Pamplona	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	1.214.342,27	-15,03%	NI
41	Conversión de la Ctra. N-121-A en vía 2+1 entre el PK 40+900 al PK 52+340 (boca sur túnel de Arrigaztelu)	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	20.964.177,55	-20,00%	NI
42	Acondicionamiento de la travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 entre pk 8+300 y pk 9+300	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	1.487.183,96	-20,00%	NI
43	Reparación estructural de daños en el puente Andelos (Mendigorría) causados por el temporal de lluvias diciembre 2021	Excavaciones Erriberri, S.L.			CO
44	Suministro e Instalación mecánica de 40 ventiladores para la renovación de los sistemas en los túneles de Belate y Almandoz	Construcciones Mariezcurrena, S.A.	1.283.837,78	1,13%	CO
sumas y valores medios			110.538.132,99	-12,80%	

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS**

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS 2021

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS EN 2021

Nº	OBRA	FECHA LIQ.	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN	%
1	Reparación y refuerzo del puente situado en el PK 0+100 de la NA-6830, sobre el río Queiles, en Cascante.	12-05-21	Díez y Compañía, S.A.	144.764,40	166.125,45	+ 14,76%
2	Acondicionamiento de las intersecciones de PK 11+340 y 12+260 de la Ctra. NA-122, Variante de Allo	10-08-21	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	694.193,07	662.794,75	- 4,52%
3	Conservación integral de las carreteras del Centro de Conservación de Irurtzun, excepto las autovías A-15, A-10 y A-1 (2018-2021)	25-10-21	Conservación Irurtzun 2018-2021 UTE	9.187.500,00	9.187.359,02	- 0,00%
4	Conservación integral de Autovías del Centro de Conservación de Irurtzun: A-15, A-10 y A-1 (2018-2021)	25-10-21	Alvac, S.A.	8.137.500,00	8.137.376,08	- 0,00%
5	Rehabilitación de firme de la carretera NA-129 (Aceso-Lodosa) entre PK 30+380 y 34+250 de la ctra. NA-134, Eje del Ebro, entre PK 76+290 y 79+250	25-10-21	Excavaciones Redondo Solozabal, S.L.	650.000,00	649.999,79	- 0,00%
6	Rehabilitación de firme de la carretera NA-120 (Estella-Beasain) entre PK 31 (Puerto de Lizarraga) y 38 (Travesía de Etxarri Aranzatz) en diferentes tramos de la A-10 (Autovía de la Barranca) entre PK 15+500 (Lakuntza) y 29+500 (Altsasu/Alsasua)	25-10-21	Asfaltos Biurrun, S.A.	950.000,00	949.992,13	- 0,00%
7	Instalación, reposición, mantenimiento y elevación de barreras de seguridad, 2018-2021	26-10-21	Vallas Castiñeiras, S.L.L.	3.625.000,00	3.624.766,56	- 0,01%
8	Conservación señalización vertical Grupo I, 2018-2021	26-10-21	Lacroix City Centro, S.A.U	2.845.000,00	2.844.615,29	- 0,01%
9	Conservación señalización vertical Grupo II, 2018-2021	26-10-21	Lacroix City Centro, S.A.U	2.845.000,00	2.844.398,89	- 0,02%
10	Pintado y repintado marcas viales Grupo Norte, 2018-2021	26-10-21	Señalizaciones Eder. S.A.	2.845.000,00	2.844.983,84	- 0,00%
11	Pintado y repintado marcas viales Grupo Sur, 2018-2021	26-10-21	Señalizaciones Eder. S.A.	2.845.000,00	2.844.994,76	- 0,00%
12	Pintado y repintado marcas viales Grupo Oeste, 2018-2021	26-10-21	Señalizaciones Eder. S.A.	2.845.000,00	2.844.982,74	- 0,00%
13	Rehabilitación de firme de la carretera N-121, Pamplona-Tudela, entre los PK 26+650 y 29+800, y NA-115, Tafalla-Peralta-Rincón de Soto entre los PK 9+700 y 12+200	29-10-21	Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	650.000,00	649.999,80	- 0,00%
14	Rehabilitación de firme de las carreteras N-113, Pamplona-Madrid, PK 98+000 y 101+380 y NA-115, Tafalla-Peralta-Rincón de Soto entre PK 13+500 y 22+500	10-11-21	Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	750.000,00	749.999,18	- 0,00%
15	Rehabilitación firme varias Ctras. Centro de Conservación de Irurtzun, 2021	15-11-21	Asfaltos Biurrun, S.A.	1.000.000,00	999.753,57	- 0,02%
16	Rehabilitación estructural del puente de la Ronda de Pamplona, PA-30 PK 0+300, situado sobre la AP-15, Autopista de Navarra	20-05-21	Construcciones Mariezcurrena, S.A.	1.335.242,86	1.335.242,86	+ 0,00%
17	Ensanche y mejora de la carretera NA-5221, tramo: Cortes - Límite de provincia	30-11-21	Construcciones Boreste, S.A.	295.356,00	298.735,05	+ 1,14%

RELACIÓN COMPLETA DE OBRAS LIQUIDADAS EN 2021


Nº	OBRA	FECHA LIQ.	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN	%
18	Estabilización y drenaje deslizamiento de tierras ocurrido en la parcela 395, Polígono 2, de Leitza	15-12-21	Lakita, S.A.	73.781,57	81.156,38	+ 10,00%
19	Adaptación de terminales de sistemas de contención metálicos en diversas carreteras de la CFN, Fase V, año 2021	15-12-21	Vallas Castiñeiras, S.L.L.	400.000,00	399.923,69	- 0,02%
20	Rehabilitación de firme de la carretera NA-138 (Pamplona-Francia por Alduides) PK 4+350 (Urtasun) y 11+600 (Cruce de Artesiaga)	23-12-21	Viaria Aglomerado, S.L.	650.000,00	649.851,76	- 0,02%
21	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Tafalla, 2021	23-12-21	Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras, S.L.	1.000.000,00	999.970,79	- 0,00%
22	Rehabilitación del firme en varias carreteras del centro de conservación de Aoiz, 2021	23-12-21	Asfaltados de Oskia, S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	+ 0,00%
23	Rehabilitación de firme de las carreteras N-240-A, Pamplona-Vitoria/Gasteiz, PK 7+200 y 11+000; PA-34, Accesos Pamplona Oeste, entre los PK 1+600 y 2+500 y PA-30, Ronda de Pamplona PK 18 al 22+000	28-12-21	Viaria Aglomerado, S.L.	1.350.000,00	1.349.975,99	- 0,00%
24	Estabilización del deslizamiento en la carretera NA-5310, PK 5+000, Ujué	30-12-21	Construcciones Mariezcurrera, S.A.	339.405,00	343.865,87	+ 1,31%
25	Modificación de la intersección del cruce del polígono industrial y campo de fútbol en la NA-134, Cárcar	30-12-21	Construcciones Boreste, S.A.	367.052,57	370.988,50	+ 1,07%
26	Rehabilitación de firme varias Ctras. Centro de Conservación de Lizarra/Estella, 2021	30-12-21	Asfaltados del Ebro, S.L.	1.000.000,00	999.997,59	- 0,00%
27	Redistribución del nudo semafórico entre la A-12 (Autovía del Camino) y la A-15 (Ronda de Pamplona) en Zizur Mayor	30-12-21	Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U.	636.126,05	651.240,50	+ 2,38%
28	Pantallas acústicas en el entorno de la PA-30 PK 14+600 al 15+350 Ezkaba (Pamplona)	30-12-21	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	580.352,72	601.154,72	+ 3,58%
						+ 0,09%
	SUMAS Y VALORES MEDIOS			49.041.274,24	49.084.245,55	

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

**RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN /
ADJUDICACIÓN DE OBRAS 2021**

AÑO 2021

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN/ ADJUDICACIÓN	Nº DE OBRAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
> 50 %	0	0,00%	-	0,00%
40 % a 50 %	0	0,00%	-	0,00%
30 % a 40 %	0	0,00%	-	0,00%
20 % a 30 %	0	0,00%	-	0,00%
10 % a 20 %	1	3,57%	144.764,40	0,31%
0 % a 10 %	6	21,43%	369.137,57	0,78%
0 %	15	53,57%	38.170.242,86	81,01%
- 10 % a 0 %	6	21,43%	8.434.193,07	17,90%
-20 % a - 10 %	0	0,00%	-	0,00%
< - 20 %	0	0,00%	-	0,00%
TOTALES	28	100,00%	47.118.337,90	100,00%

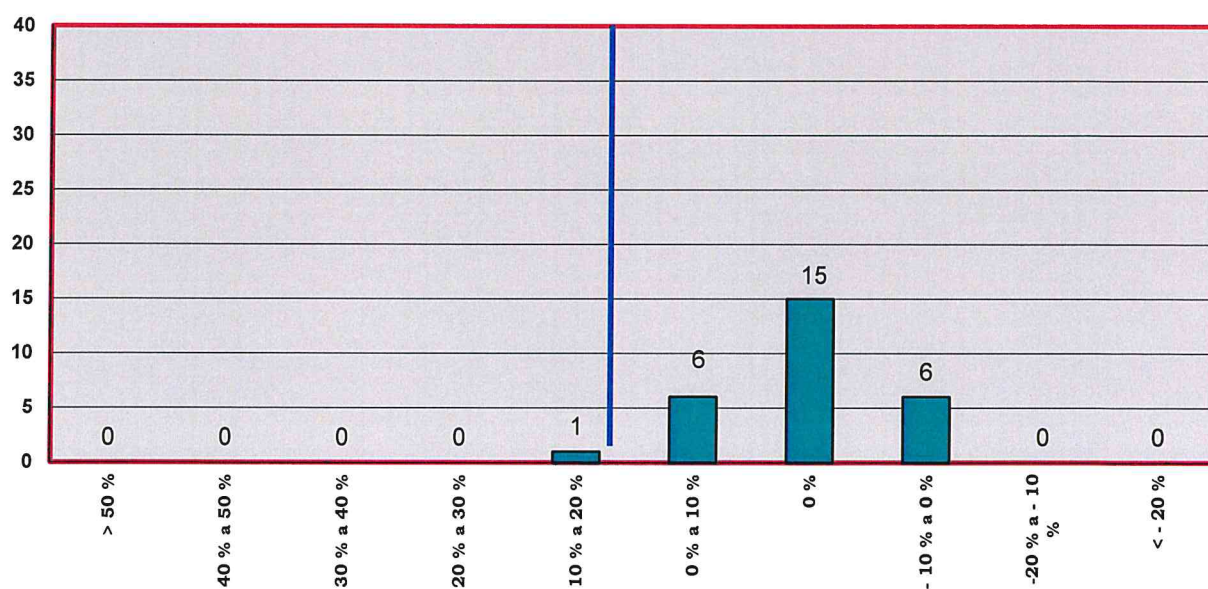

RESUMEN

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN/ ADJUDICACIÓN	Nº DE OBRAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
MAYOR DE 10 %	1	3,57%	144.764,40	0,31%
MENOR DE 10 %	27	96,43%	46.973.573,50	99,69%
TOTALES	28	100,00%	47.118.337,90	100,00%

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS**

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS 2021

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS ADJUDICADAS EN 2021

nº de orden	TÍTULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN	% BAJA	SERVICIO
1	Plan de Aforos de tráfico para la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, años 2021-2024	SICE, S.A.	304.623,96	- 10,51%	CO
2	Gestión del Centro de Control y Vigilancia de Incidencias de Vialidad en la Red de Carreteras de Navarra, años 2021-2024	Revenga Ingenieros, S.A.	2.247.912,59	- 20,00%	CO
3	Vuelo fotogramétrico digital 33cm/pixel, apoyo campo, aerotriangulación, modelos digitales de elevaciones y ortofotografía básica 25 cm/pixel territorio CFN, año 2021	Tracasa Instrumental, S.L.	133.757,02	+ 0,00%	PR
4	Cartografía de precisión del mapa Topográfico Navarra 1:500 MTNa05, término municipal Pamplona	Tracasa Instrumental, S.L.	736.492,84	+ 0,00%	Cartografía
5	Acuerdo Marco para la prestación de servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio Nuevas Infraestructuras	1*) Alinea Ingeniería y Territorio, S.L./EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L. 2*) SGS Tecnos, S.A. 3*) Peyco-Proyectos, estudios y construcciones, S.A.	466.275,92	+ 0,00%	NI
6	Comprobación de afecciones e identificación propietarios afectados y modificaciones catastrales consecuencia de proyectos año 2022	Tracasa Instrumental, S.L.	89.637,56	+ 0,00%	PR
7	Actualización de catastro, elaboración de informes y certificados para inscripción en Reg. Propiedad, año 2022	Tracasa Instrumental, S.L.	115676,44	+ 0,00%	PR
TOTAL			4.094.376,33	- 12,74%	

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN
PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAS**

RELACIÓN COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS 2021

RELACION COMPLETA DE ASISTENCIAS LIQUIDADAS EN 2021


Nº	TITULO DEL TRABAJO DE ASISTENCIA	FECHA LIQUID	CONTRATISTA ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO INIC. ADJUDIC	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN	%	SERVICIO
1	Comprobación de afecciones e identificación de propietarios afectados por proyectos de la DGOPI (R 372/2019)	4-02-21	Tracasa Instrumental, S.L.	90.767,88	90.023,15	- 0,82%	PR
2	Actualización catastro, elaboración informes y certificados preceptivos para inscripción en el Registro Propiedad parcelas adscritas al Departamento de Cohesión Territorial (R 371/19)	4-02-21	Tracasa Instrumental, S.L.	132.388,76	131.739,09	- 0,49%	PR
3	Control calidad vuelo fotogramétrico digital de 22 cm/pixel, del IGN, apoyo de campo, aerotriangulación y ortofotografía de la CFN de 2020	27-05-21	Tracasa Instrumental, S.L.	146.334,69	146.334,63	- 0,00%	PR
4	Asistencia expropiaciones N-121-A PK 10+500, travesía de Olave y el 22+500 (R. 608/2020)	4-08-21	Tracasa Instrumental, S.L.	46.463,95	16.833,12	- 63,77%	PR
5	Plan de Aforos de tráfico para la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, 2017-2020	6-08-21	UTE LRA-LCA/Aforos	271.979,30	281.917,15	+ 3,65%	CO
6	Vuelo fotogramétrico digital 33cm/pixel, apoyo campo, aerotriangulación, modelos digitales de elevaciones y ortofotografía básica 25 cm/pixel territorio CFN, año 2021	17-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	133757,02	133757,02	+ 0,00%	PR
7	Digitalización, georreferenciación e incorporación a la fototeca de los negativos de vuelos históricos desde 1985 hasta 1991	17-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	100.692,10	101.574,53	+ 0,88%	PR
8	Trabajos de actualización de cartografía SIG, formato BTA del Mapa Topográfico de Navarra escala 1:5000 (MTNA5) de toda la CFN	17-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	174.065,68	174.059,37	- 0,00%	PR
9	Asist. Técnica expropiaciones bienes y derechos proyecto de Ensanche y mejora de la ctra. NA-6008, Salinas de Pamplona-Esparza de Galar	30-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	15.378,80	15.403,10	+ 0,16%	PR
10	Asist. Expropiaciones Conversión de la N-121-A en vía 2+1 entre el PK 40+900 y el PK 52+430 (boca sur del túnel de Arrigaztelu)	31-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	21.486,75	21.462,53	- 0,11%	PR
11	Asist. Técnica expropiaciones terrenos del proyecto de Ensanche y mejora de la ctra. NA-128, Tramo: Caparroso-Mélida	31-12-21	Tracasa Instrumental, S.L.	29.086,65	28.651,08	- 1,50%	PR
SUMAS Y VALORES MEDIOS				1.162.401,58	1.141.754,77	- 1,78%	

SERVICIO PROMOTOR	
NI	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
CO	CONSERVACIÓN

**RESUMEN DE DIFERENCIAS LIQUIDACIÓN /
ADJUDICACIÓN DE ASISTENCIAS 2021**

AÑO 2021

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN/ ADJUDICACIÓN	Nº DE ASISTENCIAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
> 50 %	0	0,00%	-	0,00%
40 % a 50 %	0	0,00%	-	0,00%
30 % a 40 %	0	0,00%	-	0,00%
20 % a 30 %	0	0,00%	-	0,00%
10 % a 20 %	0	0,00%	-	0,00%
0 % a 10 %	3	27,27%	388.050,20	33,38%
0 %	3	27,27%	454.157,39	39,07%
- 10 % a 0 %	4	36,36%	273.730,04	23,55%
-20 % a - 10 %	0	0,00%	-	0,00%
< - 20 %	1	9,09%	46.463,95	4,00%
TOTALES	11	100,00%	1.162.401,58	100,00%

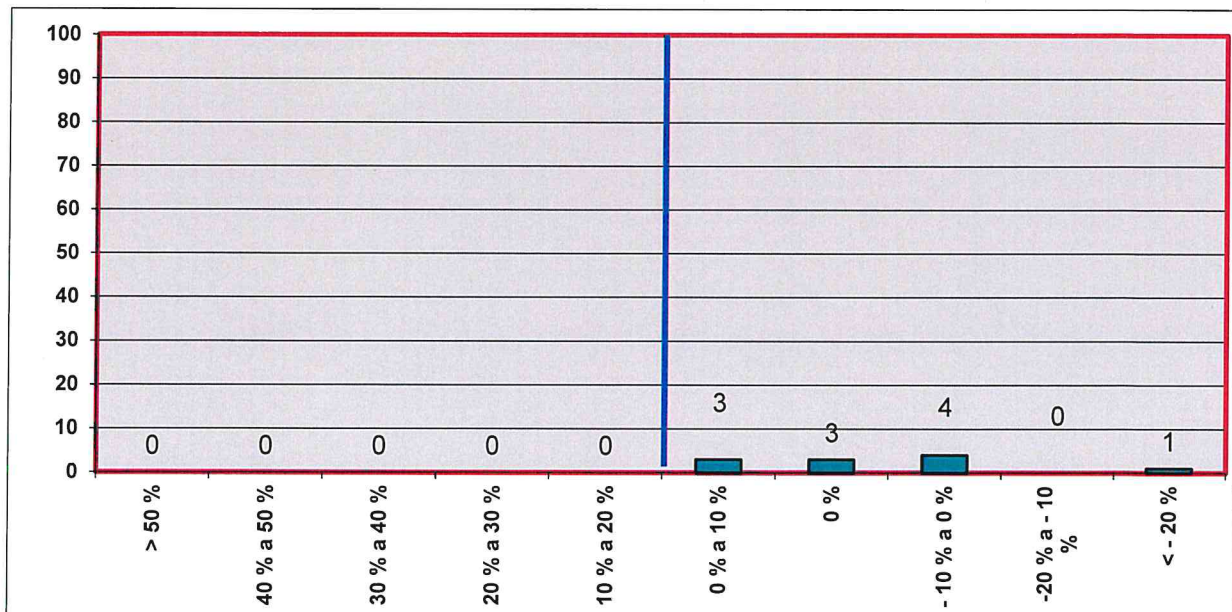

RESUMEN

DIFERENCIA LIQUIDACIÓN/ ADJUDICACIÓN	Nº DE ASISTENCIAS	%	SUMAS DE PRESUPUESTOS ADJUDICACIÓN	%
MAYOR DE 10 %	0	0,00%	-	0,00%
MENOR DE 10 %	11	100,00%	1.162.401,58	100,00%
	11	100,00%	1.162.401,58	100,00%

